



RESUME SUR LE PROJET D'AVENANT PADAEPA

Intervention – BKF1602611.

PROJET D'APPUI AUX DROITS A L'ACCES A L'EAU
POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE
FADA N'GOURMA (REGION DE L'EST) - PADAEPA

Burkina Faso

2016-2022

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....	2
RESUME SUR LE PROJET D'AVENANT PADAEPA	3
1. Contexte général	3
2. Objectifs de l'intervention.....	3
3. Les résultats attendus de l'intervention.....	3
4. Etat d'avancement à ce jour	3
4.1 Résumé sur l'état d'avancement du projet PADAEPA au 31/12/2020.....	4
4.2 Résumé sur l'état du Budget exécuté et disponible.....	11
4.3 Planification des objectifs visés de 2021 à 2022	12
5. Evaluation du Budget de l'Avenant.....	12
6. Planning de mise en œuvre de l'Avenant.....	17

RESUME SUR LE PROJET D'AVENANT PADAEPA

1. Contexte général

Le projet PADAEPA s'inscrit dans le cadre du retour de la coopération bilatérale Belge au Burkina Faso. Il vise à accroître l'accès à l'eau potable dans la ville de Fada N'Gourma, situé dans la région de l'Est, tout en veillant à l'amélioration de l'assainissement. Allant dans le sens des orientations nationales du secteur, le projet développe sa stratégie au travers d'une approche fondée sur les droits humains.

2. Objectifs de l'intervention

L'objectif général du projet est de « **contribuer à l'atteinte des ODD dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu urbain par l'accroissement de l'accès durable à l'eau potable, développement de l'assainissement et à la promotion du droit d'accès à ces services** »

L'objectif spécifique se décline comme suit : « **l'accès durable à l'eau potable et l'assainissement adéquat sont améliorés dans la ville de Fada N'Gourma** »

3. Les résultats attendus de l'intervention

Afin de contribuer à l'atteinte de cet objectif, les résultats suivants sont attendus :

- **Résultat 1 : L'approvisionnement en eau potable est amélioré :** Les activités visent à accroître les capacités de production existantes et à adapter le réseau de distribution d'eau pour répondre aux besoins de la population de la ville.
- **Résultat 2 : L'assainissement est amélioré :** Initialement prévu de réaliser une action d'appui pour organiser le système de collecte des boues de latrines et fosses septiques et construire un système de traitement de boues en vue de leur valorisation pour l'agriculture, **les actions à mener pour l'atteinte de ses résultats seront plutôt la construction de 318 latrines scolaires en milieu scolaire.**
- **Résultat 3 : Les droits des titulaires sont respectés et les devoirs des détenteurs sont acquittés :** Les titulaires de droit (bénéficiaires) sont au centre de la stratégie de la présente intervention. Les activités de sensibilisation porteront sur l'amélioration des comportements des titulaires de droits en matière d'hygiène et d'assainissement afin de garantir une utilisation raisonnée et durable de l'eau. Les devoirs des détenteurs de droits seront améliorés pour assurer la qualité du service (transparence, redevabilité) par des formations visant l'ONEA et d'autre acteur de l'eau (fonteniers, plombiers,)

4. Etat d'avancement à ce jour

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l'état d'avancement du projet PADAPEPA :

4.1 Résumé sur l'état d'avancement du projet PADAEPA au 31/12/2020

Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
A010	L'approvisionnement en eau potable est amélioré		35,2%	
A0101	Réalisation des études techniques et suivi des travaux d'AEP	Régie	91.1%	<p>Pour améliorer efficacement l'accès à l'eau potable, la phase initiale du projet prévoyait la réalisation des infrastructures de production et de stockage d'eau (station de pompage, station de traitement, des baches relevage et de stockage d'eau). C'est le projet actuel.</p> <p>Sachant que la réalisation des infrastructures de distribution d'eau dans la ville de Fada N'Gourma (réseau secondaire et tertiaire, kits de distribution d'eau privé) a dû être abandonné suite aux réorientations nécessaires au début du projet (grosse disparité entre le projet présenté initialement par ONEA et les résultats des études de SHER en 2017).</p> <p>Certains travaux libellés en option dans le marché initial sont pris en compte dans l'offre de l'entreprise ASI-BF (Option 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6) et peuvent être commandés. A noter que les prix sont déjà indiqués dans le contrat de l'entreprise et ne pourront pas être modifiés.</p> <p>En effet, le marché de l'entreprise ASI-BF d'un montant total de 7 543 668.89 € est subdivisé comme suite :</p> <ol style="list-style-type: none"> Offre de base (sécurité, installation de chantier, station de pompage, station de traitement y compris les équipements annexes pour le traitement, réseau d'adduction et de refoulement, ouvrage de stockages) + Option 7 (troisième filière de la station de traitement) = 6 080 655.93 € parties du marché en cours d'exécution ; Option 1 d'un montant de 70 151.31 €, représente la construction d'un barrage flottant ;
A0102	Amélioration des capacités de production des infrastructures existantes	Cogestion	100%	
A0103	Augmentation de la capacité de production d'eau potable pour la ville de Fada	Régie	0.00%	
A0104	Extension du réseau de distribution d'eau de Fada N'Gourma	Régie	0.00%	

Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
A0105	Réalisation des travaux d'adduction d'eau potable pour la ville de Fada N'gourma (Traitement, stockage et distribution) -Tranche ferme	Régie	34%	<p>3. Option 2 d'un montant de 88 634.93 €, représente la construction d'un Logement pour le chef de station et logement double ;</p> <p>4. Option 3 d'un montant de 681 266.13 €, représente la fourniture et la pose du réseau de distribution secondaire dans la ville de Fada N'Gourma (25 km) ;</p> <p>5. Option 4 d'un montant de 283 231.80 €, représente la fourniture et la pose du réseau de distribution tertiaire dans la ville de Fada N'Gourma (21 km) ;</p> <p>6. Option 5 d'un montant de 221 846.25 €, représente la fourniture de plus de 500 kits de branchement ;</p> <p>7. Option 6 d'un montant de 74 409.82 €, représente la fourniture des équipements de Défense incendie de la ville de Fada N'Gourma ;</p> <p>La phase 2 du programme consistera à l'activation des Option 2, 3, 4, 5 et 6 du marché auquel l'Entreprise ASI-BF reste contractuellement engagé jusqu'au 20 avril 2022.</p> <p>La mise en œuvre des options 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6 couplés avec les travaux en cours permettra d'atteindre les objectifs initialement prévus par le projet.</p> <p>Sachant que le taux d'accès à l'eau potable dans la ville de Fada est de d'environ 70% (observations de terrain) et pourrait être amélioré à 95 % à la suite de la réalisation des options 3, 4, 5 et 6 (élimination des corvées d'eau et des longues files d'attente aux Bonnes fontaines).</p>

Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
				<p>En effet, les taux d'accès du milieu urbain de Fada ont évolué de 45% en 2008 à 70% en 2015. Le nombre important de forages non fonctionnels, conjugué à la faible capacité de desserte de l'ONEA entraîne une insuffisance cruciale en matière d'eau potable dans la ville de Fada. Tous les onze (11) secteurs de la ville de Fada sont concernés, surtout les parties périphériques des différents secteurs. Le problème s'accroît en période chaude entre février et juin de l'année avec de longues files d'attente au niveau des bornes fontaines. La pénurie d'eau qui dure pendant plusieurs jours pousse certains ménages à parcourir les distances de plus d'un kilomètre à la recherche d'eau dans les forages.</p> <p>Sachant que la zone urbanisée couverte par le réseau du système d'Adduction d'Eau Potable est de moins de 40% et pourrait passer à 100% pour améliorer la qualité du service d'eau dans les ménages à la suite de la réalisation des options 3, 4, 5 et 6 (amélioration de la qualité et du service d'eau dans les ménages)</p> <p>Sachant que d'autres travaux supplémentaires non prévus dans l'offre de l'entreprise devront faire l'objet d'un avenant par rapport au contrat d'ASI-BF :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les ajustements sur les quantités à cause des résultats des études d'Avant-Projet Détaillées présentant quelques lacunes techniques (Surplus pour la Modification des pompes de relevage au niveau de la bache de 200 m³ dû à la modification de la bache de Boudangou, modification des pompes de relevage au niveau de la bache de 200 m³) ; - La prise en compte des aspects sécuritaires pour la protection des équipements de la station de traitement (Fourniture et pose de barbelé pour la clôture maçonnée, modification du portail, déplacement de la commande station de pompage vers la station de traitement, Electrification de la station de traitement par 20 lampadaires électriques, clôture en maçonnerie pour logement double, Porte métallique).

Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
				<p>Sachant que la durabilité potentielle du projet est garanti par les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ONEA, qui devra gérer les infrastructures réalisées dans le cadre du Projet, donne toujours de bonnes garanties quant à ses capacités à assurer le service d'eau potable et l'entretien des infrastructures du système d'adduction d'eau potable Fada N'Gourma ; - Considérant que des investissements considérables sont toutefois à programmer par le pays partenaire à travers l'ONEA pour assurer la desserte en eau à long terme de la ville de Fada, une fois que la ressource actuellement exploitée (lac de Tandjari) aura atteint ses limites. La mobilisation des ressources alternatives devra être prise en charge par les phases ultérieures décrites dans le Schéma directeur eau potable de Fada N'Gourma ; - Le ministère de l'eau et l'assainissement (MEA) à travers sa Direction Régionale, l'ONEA et la Mairie de Fada N'Gourma à travers sa cellule technique EPCD sont fortement impliqués dans le projet.

Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
A020	L'assainissement de la ville de Fada N'Gourma est amélioré		100%	
A0205	Réalisation des travaux de construction de latrines en milieu scolaire avec prise en compte des personnes à mobilité réduite	Cogestion	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Les travaux de construction de latrine en milieu scolaires sont achevés : Il a été construit et réhabilité au total 314 latrines dans 21 écoles (soit la construction de 196 latrines neuves et la réhabilitation de 118 latrines). On estime avoir touché environ 12 665 élèves (dont 6 532 filles, 6 133 garçons et 33 élèves à mobilité réduite). - Sachant que le taux d'accès à un ouvrage d'assainissement en milieu scolaire est moins de 35% (Observation terrain au cours de l'Intermédiation sociale) et que beaucoup d'écoles dans la ville de Fada N'Gourma ont exprimé le besoin d'infrastructure sanitaire, nous proposons qu'ils puissent être réalisés une phase 2 de construction des latrines en milieu scolaire (150 latrines) ; - Afin d'assurer la durabilité des infrastructures réalisés, leur entretien reste un défi très important et doit être pris en compte. Ainsi, nous proposons un accompagnement adéquat pour permettre la pérennité des infrastructures en milieu scolaire.
A0206	Elaboration du DAO, contractualisation et suivi des travaux de construction de latrines en milieu scolaire	Régie	100%	

Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
A030	Les droits des titulaires sont respectés et les devoirs des détenteurs sont acquittés		76%	
A0301	Sensibilisation sur les droits et devoirs des titulaires de droits	Régie	100%	<ul style="list-style-type: none"> - La sensibilisation sur la consommation de l'eau potable, l'accès à hygiène et l'assainissement a touché 4 897 ménages de la ville de Fada N'Gourma sur 8 445 ménages (soit 58% des ménages de Fada N'Gourma). - Sachant que la durabilité après d'une intervention dépend de la durée de la campagne de la sensibilisation et sachant que le temps d'intervention (1 an) a été très court pour apporter et mesurer un changement de comportement au sein de la population de Fada N'Gourma dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, nous proposons de réaliser une seconde campagne de sensibilisation sur une durée d'une (01) année pour pérenniser la dynamique proposée.
A0302	Formations des détenteurs d'obligations et des acteurs du secteur de l'eau (Subside CEMEAU)	Cogestion	75%	<ul style="list-style-type: none"> - 75% des activités de la convention de subside BKF1602611/CSUB/001 a été mis en œuvre (soit 6 formations sur 8). Pour cause de crise sanitaire Covid-19 et les retards dans la programmation des sessions de formation par le CEMEAU, les deux autres sessions de formation seront réalisées au premier trimestre de l'année 2021.
A0303	Amélioration de la communication et de l'accessibilité du service	Régie	50%	
A0304	Amélioration du monitoring des infrastructures via technologies numériques	Cogestion	50%	


Code	Résultats attendus/activités	Mode de gestion	Taux d'exécution	Observations/commentaires
A0305	Renforcement de l'ONEA en matière d'OM	Cogestion	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Le matériel de recherche des fuites dans le réseau (RPE) a été livré à 100%. - Afin d'assurer la durabilité des équipements, leur utilisation et maintenance reste un défi très important et doit être pris en compte. Ainsi, nous proposons un accompagnement adéquat pour permettre la pérennité des équipements fournis

4.2 Résumé sur l'état du Budget exécuté et disponible

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l'exécution et planification financière globale de l'intervention.

Résultats	Budget (EUR)	Dépense (EUR)	Planification (EUR)		Solde après planification (EUR)	Imprévu (EUR)	Solde restant Probable après les imprévus (EUR)
		Dépenses Σ Au 31/12/2020	2021	2022			
Output 1	7 642 500	2 388 206	2 659 610	2 337 725	256 959	150 000	106 959
Output 2	540 000	470 247	7 680	21 016	41 058		41 058
Output 3	370 000	233 106	66 357	3 488	67 049		67 049
Total Moyens généraux (Z)	1 447 500	1 047 894	249 495	166 495	- 16 384	50 000	- 66 384
TOTAL	10 000 000	4 139 453	2 983 141	2 528 724	348 682	200 000	148 682

Exécution & Planification financière globale Intervention - PADAEPA

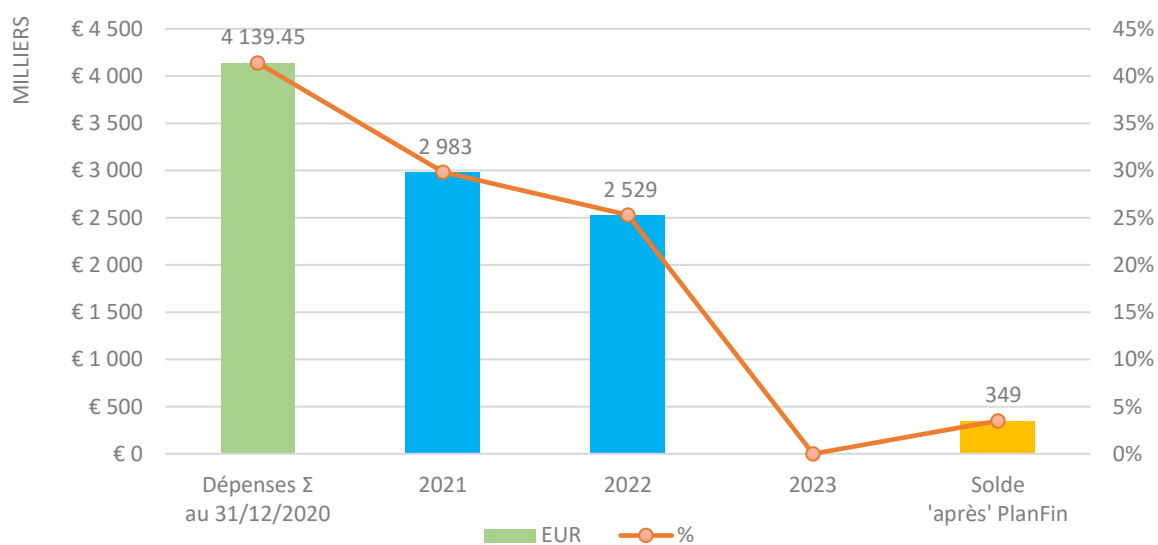

4.3 Planification des objectifs visés de 2021 à 2022

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des objectifs visés de 2021 à 2022 pour le programme

Résultats	Taux d'exécution physique	Planification du taux d'exécution du projet pour 2021				Planification du taux d'exécution du projet pour 2022		
	Taux cumulé Au 31/12/2020	T1	T2	T3	T4	T1	T2*	T3**
Output 1	31.7 %	40%	51.4%	58%	63.9%	70.2%	76.4%	76.4%
Output 2	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%	5.4%
Output 3	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.5%	3.5%	3.7%	3.7%
Total Moyens généraux (Z)	8.7%	9.6%	10.4%	11.3%	12.2%	13%	13.9%	14.5%
Taux d'exécution global du projet	49%	57%	71%	78%	85%	92%	99%	100%

* Fin des grands travaux d'AEP dans la ville de Fada le **30 avril 2022**

** La clôture du programme est fixée le **21 août 2022**.

5. Evaluation du Budget de l'Avenant

Le tableau ci-dessous fait la synthèse du Budget de l'Avenant du projet PADAEPA. Les détails explicatifs se trouvent en annexe dans le rapport d'Avenant du programme.

La période de mise en œuvre de l'avenant doit couvrir de janvier 2022 à mars 2023 (Soit 15 mois d'intervention, donc 13 mois pour la réalisation des travaux et 2 mois pour la clôture du programme).

La date de démarrage de l'avenant prévu au plus tard le 04 janvier 2022.

CODE	RÉSULTATS ATTENDUS/ACTIVITÉS	BUDGET AVENANT PADAEPA de JANVIER 2022 MARS 2023 (Euros)
A010	L'approvisionnement en eau potable est amélioré	1 930 860.00
A020	L'assainissement de la ville de Fada N'Gourma est amélioré	335 000.00
A030	Les droits des titulaires sont respectés et les devoirs des détenteurs sont acquittés	190 000.00
Z	Moyens Généraux (Z)	294 260.00
Total de l'Avenant		2 750 120.00

CODE	RÉSULTATS ATTENDUS/ACTIVITÉS	BUDGET (EUROS)	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
A010	L'approvisionnement en eau potable est amélioré	1 930 860.00	
A0101	Réalisation des études techniques et suivi des travaux d'AEP	70 000.00	Marché à exécuter par TRACTEBEL/ANTEA dans le cadre de l'avenant au contrat BKF 057 PNSP pour uniquement le suivi des travaux.
A0105	Réalisation des travaux d'adduction d'eau potable pour la ville de Fada N'gourma (Traitement, stockage et distribution) - Tranche optionnelle 2-3-4-5-6	1 416 860.00	Marché à exécuter par l'Entreprise ASI-BF dans le cadre de l'activation des options 2-3-4-5-6 au contrat BKF 094 entre ASI-BF et ENABEL
	Option 2 représente la construction d'un Logement pour le chef de station et logement double ;	88 634.93	
	Option 3 représente la fourniture et la pose du réseau de distribution secondaire dans la ville de Fada N'Gourma (25 km) ;	681 266.13	
	Option 4 représente la fourniture et la pose du réseau de distribution tertiaire dans la ville de Fada N'Gourma (21 km) ;	283 231.80	
	Option 5 représente la fourniture de plus de 500 kits de branchement ;	221 846.25	
	Option 6 représente la fourniture des équipements de Défense incendie de la ville de Fada N'Gourma ;	74 409.82	
	Imprévu 5% du montant total	67 469.45	
A106	Travaux supplémentaires non prévus dans l'offre de l'entreprise feront l'objet d'Avenant 2 AEP	444 000.00	
	Surplus pour la Modification des pompes de relevage au niveau de la bache de 200 m3 ; Fourniture et pose de tuyaux PEHD DE315 pour la traversé du bas-fond	60 000.00	Marché à exécuter par l'Entreprise ASI-BF dans le cadre de l'Avenant 2 à négocier avec ASI-BF conformément aux dispositions du contrat BKF 094

CODE	RÉSULTATS ATTENDUS/ACTIVITÉS	BUDGET (EUROS)	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
	La prise en compte des aspects sécuritaires pour la protection des équipements de la station de traitement (Fourniture et pose de barbelé pour la clôture maçonnée du site de la station de traitement, modification du portail d'entrée principale, déplacement de la commande station de pompage vers la station de traitement, Electrification de la station de traitement par 20 lampadaires électriques, clôture en maçonnerie pour logement double, Porte métallique)	264 000.00	
	Qualité de l'eau à l'entrée de la station : réalisation d'un débourbeur	120 000.00	Cette activité fait l'objet d'un débat nous souhaitons que ASI-BF le réalise pour améliorer le rendement de la station de traitement car la même station réalisée à Dori à un rendement de 50 à 75% au lieu de 95% comme prévu dans les cahiers charges. L'analyse montre que c'est à cause de la turbidité de l'eau très élevé.
A020	L'assainissement de la ville de Fada N'Gourma est amélioré	335 000.00	
A0205	Réalisation des travaux de construction de latrines en milieu scolaire (objectif réaliser 150 latrines supplémentaire dans 10 écoles)	250 000.00	Elaboration du DAO et Marché à lancer
A0206	Elaboration du DAO, contractualisation et suivi des travaux de construction de latrines en milieu scolaire y compris des formations sur 6 mois sur le nettoyage et l'entretien des infrastructures d'assainissement.	85 000.00	
A030	Les droits des titulaires sont respectés et les devoirs des détenteurs sont acquittés	190 000.00	

CODE	RÉSULTATS ATTENDUS/ACTIVITÉS	BUDGET (EUROS)	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
A0301	Sensibilisation sur les droits et devoirs des titulaires de droits	110 000.00	Elaboration du DAO et Marché à lancer par Enabel
A0302	Formations des détenteurs d'obligations et des acteurs du secteur de l'eau (Subside CEMEAU)	20 000.00	L'activé interviendra dans convention de subside BKF 1602611/CSUB/001 à prolonger
A0303	Amélioration de la communication et de l'accessibilité du service	30 000.00	
A0304	Amélioration du monitoring des infrastructures via technologies numériques	20 000.00	
A0305	Renforcement de l'ONEA en matière d'OM	10 000.00	L'activé interviendra dans convention de subside BKF 1602611/CSUB/001 à prolonger
Z	Moyens Généraux (Z)	294 260.00	
Z010100	Migration UBW : Co-responsable (ECT)		<ul style="list-style-type: none"> - Le projet est planifié jusqu'en juillet 2022. - Sachant que l'équipe de PADAEPA composé d'un IM, 2 ATN, 2 Chauffeurs, 1 Comptable et une Secrétaire est disposé de continué jusqu'en mars 2023
Z010200	Migration UBW : Assistant technique national / ingénieur	47 424.00	
Z010300	Migration UBW : Gestionnaire administratif et financier	15 756.00	
Z010400	Migration UBW : Secrétaire	20 280.00	
Z010500	Migration UBW : Chauffeurs	23 400.00	
Z010601	Assistant technique National Senior	62 400.00	
Z010701	Assistant Technique National Junior		
Z020100	Migration UBW : Véhicules		
Z020200	Migration UBW : Equipement bureau		
Z020300	Migration UBW : Equipement IT		
Z030100	Migration UBW : Frais de véhicules/déplacement	10 800.00	

CODE	RÉSULTATS ATTENDUS/ACTIVITÉS	BUDGET (EUROS)	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
Z030200	Migration UBW : Télécommunications	4 800.00	
Z030300	Migration UBW : Fournitures de bureau	1 200.00	
Z030400	Migration UBW : Location/réhabilitation d'un bureau (FADA)	14 400.00	
Z030500	Migration UBW : frais de missions	9 600.00	
Z030600	Migration UBW : frais de gardiennage	9 600.00	
Z040100	Migration UBW : Baseline	9 600.00	
Z040200	Migration UBW : Audit	15 000.00	
Z040300	Migration UBW : Evaluations (mi-parcours et finale)	25 000.00	
Z040400	Migration UBW : Backstopping technique et organisationnel	25 000.00	
Z999800	Migration UBW : Conversion rate ajustement REG		
Z999900	Migration UBW: Conversion rate adjustment COG		
	Total de l'Avenant	2 750 120.00	

6. Planning de mise en œuvre de l'Avenant

La période de mise en œuvre de l'avenant doit couvrir de janvier 2022 à avril 2023 (Soit 15 mois d'intervention, donc 13 mois pour la réalisation des travaux et 2 mois pour la clôture du programme).

Sachant que la date de démarrage de l'avenant est prévue au plus tard le 04 janvier 2022, il sera intéressant que toutes les démarches administratives suivantes soient terminées au 31 décembre 2021 :

- Validation de l'avenant ;
- Montage et signature de l'avenant ;
- Approbation de l'Avenant au niveau du Ministère de l'eau et de l'Assainissement.



PLANIFICATION DES ACTIVITES DE PADAEPA AVENANT PADAEPA 2022-2023

Code Projet	Activités	Responsable	Début	Fin	Trimestre																																									
					Trimestre 1							Trimestre 2							Trimestre 3							Trimestre 4							Trimestre 1													
					déc-21	janv-22			févr-22			mars-22			avr-22			mai-22			juin-22			juil-22			août-22			sept-22			oct-22			nov-22			déc-22			janv-23			févr-23	
23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30	8	15	23	30					
	Démarches administratives pour la recherche de financement	SUIVI = RR + IM	01/04/2021	31/12/2021	←																																									
A01 et A03	PADAEPA Phase 1: Mise en œuvre du projet jusqu'au 21 Août 2022	SUIVI = IM	04/01/2022	31/08/2022	←																																									
A01 - Approvisionnement en eau potable est amélioré																																														
BKF1602611_A010100	Réalisation des études techniques et suivi des travaux d'AEP	SUIVI = IM	04/01/2022	31/01/2023	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A010500	Réalisation des travaux d'adduction d'eau potable pour la ville de Fada Ngourma- Offre de base	SUIVI = IM	04/01/2022	31/12/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A010600	Travaux supplémentaires non prévus dans l'offre de l'entreprise feront l'objet d'Avenant 2 AEP	SUIVI = IM	04/01/2022	30/04/2022	[Barre bleue]																																									
A02 - L'assainissement de la ville de Fada NGourma est amélioré																																														
BKF1602611_A020500	Réalisation des travaux de construction de latrines scolaires	SUIVI = ATN	01/04/2022	31/07/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A020600	Elaboration du DAO, contractualisation et suivi des travaux de construction de latrines en milieu scolaire y compris des formations sur 6 mois sur le nettoyage et l'entretien des infrastructures d'assainissement.	SUIVI = ATN	01/03/2022	31/08/2022	[Barre bleue]																																									
A03 - Les droits des titulaires sont respectés et les devoirs des détenteurs sont acquittés																																														
BKF1602611_A030100	Sensibilisation titulaires de droit (eau, hygiène, assainissement, gaspillage, conservation)	SUIVI = ATN/SE	04/01/2022	31/12/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A030200	Formations des détenteurs d'obligations et des acteurs du secteur de l'eau (Subside CEMEAU)	IM+ATN/SE+CEMEAU	04/01/2022	31/06/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A030300	Amélioration de la communication et de l'accessibilité du service	SUIVI = ATN/SE	04/01/2022	31/12/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A030400	Amélioration du monitoring des infrastructures via technologies numériques	SUIVI = ATN/SE	04/01/2022	31/12/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_A030500	Renforcement de l'ONEA en matière d'OM																																													
X-Z - Activités de gestion																																														
BKF1602611_X et Z	Suivi et Evaluation des activités																																													
BKF1602611_Z040200	Migration UBW: Audit	SUIVI = IM	06/01/2022	31/03/2023	← [Barre rouge] →																																									
	Suivi des activités mensuelles et élaboration d'une Note d'information sur l'état d'avancement des activités	IM+ATN+ATN/SE	Avant le 05 du mois suivant	Avant le 05 du mois suivant	[Étoiles rouges]																																									
	Evaluation trimestrielle des activités	IM	Avant le 05 du Trimestre	Avant le 05 du Trimestre	[Barres bleues]																																									
	Audit externe	RR+SIEGE	01/01/2022	31/01/2022	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_Z040300	Evaluations (mi-parcours et finale)	RR+SIEGE	01/02/2023	28/02/2023	[Barre bleue]																																									
BKF1602611_Z040400	Backstopping technique et organisationnel	RR+SIEGE			[Barre bleue]																																									
	Clôture du programme PADAEPA	TOUT LE MONDE	01/02/2023	31/03/2023	[Barre bleue]																																									

Légende:

RR: Représentant résident
IM : Intervention Manager
ATN: Assistant Technique National

← [Barre rouge] → : Activité partielle

← [Barre noire] → : Activité permanente

[Barre bleue] : Tâches

[Étoile rouge] : Activité ponctuelle

[Carré jaune] : Rapport trimestriel de Suivi-Evaluation

ATN/SE: Assistant Technique National en Suivi-Evaluation

SEC: Expert Sécurité

ECA: Expert en Contractualisation

MDC: Mission De Contrôle des travaux

Elaboré par :

Nom : Alex TAGOUKAM , Ibrahim BADINI, Miranise OUEDRAOGO
Qualité : Equipe de PADEAPA
Date :
Visa :

Approuvé par :

Nom : ONEA
Qualité :
Date :
Visa :

Validé par :

Nom : Olivier KRINS
Qualité : Représentant Résident
Date :
Visa :
